



À : Mario Boccucci
Secrétariat du Programme ONU-REDD

De : Le Secrétaire du comité de Pilotage
Dr Napari YEO
Point Focal du processus REDD+ intérimaire
Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ intérimaire
République de Côte d'Ivoire

Objet : Demande de prolongation sans frais additionnel
Programme National ONU-REDD en République de Côte d'Ivoire

Approbation

Nous vous informons à travers ce mémorandum que le Comité de Pilotage du Programme National ONU-REDD en République de Côte d'Ivoire a pris la décision de demander une prolongation sans frais additionnel de la mise en œuvre du programme national pour une durée de 07 mois. Le Programme National sera ainsi clôturé en avril 2018.

La République de Côte d'Ivoire est consciente de l'importance du Programme National ONU-REDD mis en place dans le pays afin d'appuyer son processus REDD+. En effet, le Programme National apporte un soutien important pour l'élaboration de sa stratégie nationale, la construction des outils de mise en œuvre du mécanisme dont le système national de surveillance de forêt, le niveau de référence des forêts et le système d'information sur les sauvegardes, et dans les renforcements de capacité nationaux. Il est ainsi nécessaire au Programme national d'appuyer efficacement la République de Côte d'Ivoire jusqu'à la finalisation de ces outils.

La mise en œuvre du Programme National a connu quelques retards causés principalement par des facteurs externes au programme lui-même. Des mesures ont été prises afin de pouvoir mettre en œuvre avec les qualités requises les activités prévues et utiliser le budget restant non utilisé. La prolongation sans frais additionnel est considérée comme une de ces mesures demandées par les parties prenantes au processus.

Évaluation de la mise en œuvre du Programme National

Selon le cadre de suivi et d'évaluation du Programme, le Programme National continuera à produire les rapports annuels et semestriels mandataires. La République de Côte d'Ivoire soumettra ces rapports au Secrétariat du Programme ONU-REDD. Par ailleurs, une évaluation finale du Programme National sera réalisée avant la fermeture finale dudit programme en Avril 2018.

PROGRAMME
ONU-REDD



Activités et budget de la période de prolongation du Programme National ONU-REDD en République de Côte d'Ivoire (Octobre 2017 à Avril 2018)

Abidjan, le 26 Mai 2017

Une demande de prolongation sans fonds complémentaires de 07 mois (couvrant la période allant d'Octobre 2017 à Avril 2018) a été soumise et validée au Comité de Pilotage du Programme National ONU-REDD du 26 Mai 2017. Cette prolongation permettra la mise en œuvre et la finalisation des activités prévues dans le Programme. Les éléments mentionnés ci-dessous détaillent les activités identifiées et le budget nécessaire à la mise en œuvre de ces activités durant la période de prolongation.

| Résultats attendus | | Agence | Planification | | Budget (USD) | Observations |
|---|--|--------|---------------|------|--------------|---|
| | | | 2017 * | 2018 | | |
| Résultat 1 : La coordination et l'implication des parties prenantes sont renforcées | | | | | | |
| Réalisation 1.1 | Gestion nationale du processus REDD+ et du programme ONU-REDD en Côte d'Ivoire | FAO | X | X | 43 105 | |
| Réalisation 1.2 | Renforcement de l'équipe nationale de gestion | FAO | X | X | 350 493 | |
| Réalisation 1.3 | Renforcement de l'engagement multipartenaire autour de la REDD+ | PNUD | X | X | 65 176 | |
| Résultat 2 : Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en œuvre | | | | | | |
| Réalisation 2.1 | L'analyse sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts est effectuée | FAO | | | | Activité achevée |
| Réalisation 2.2 | Définition et formulation des options stratégiques REDD+ | PNUD | X | X | 113 033 | Mise en compte des commentaires de la stratégie |
| Réalisation 2.3 | Construction de la Stratégie nationale REDD+ | PNUD | X | X | 28 764 | Appui à l'insertion de la stratégie dans les politiques sectorielles du gouvernement. |
| Réalisation 2.4 | Outils de mise en œuvre de la Stratégie nationale REDD+ | PNUD | X | | 100 000 | Activité achevée en 2016 mais clôturée financièrement au début 2017. |

| | | | | | | |
|--|--|------|---|---|--------------|--|
| Réalisation 2.6 | Analyse spatiale des bénéfices multiples | PNUE | X | X | - | Activité lancée et fonds déjà engagés, mais nécessité de finalisation |
| Résultat 3 : Un SNSF alimenté par des FE et des DA préliminaires et relié au SIS est conçu de manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles | | | | | | |
| Réalisation 3.1 | Les parties prenantes sont formées sur les méthodes de collecte et de suivi des DA et FE | FAO | X | X | 93 474 | Appui technique à l'unité MRV |
| Réalisation 3.2 | Les DA et FE existantes sont compilées dans des bases de données | FAO | X | X | 35 000 | |
| Réalisation 3.3 | Des DA et FE préliminaires sont établis selon les besoins identifiés par le SEP REDD+ | FAO | X | X | 49 311 | |
| Réalisation 3.4 | L'entretien et le fonctionnement du portail pour le SNSF est assuré | FAO | | | | Le plan d'action SNSF est finalisé. Le portail REDD+ n'est pas couverte par l'NUREDD pour cause de duplication avec le soutien de l'AFD à la Cdi. Enlevé de la programmation par le COPIL du 13 octobre 2016. |
| Réalisation 3.5 | Système d'Information sur les Sauvegardes (SIS) alimenté par des données préliminaires intégré au SNSF | PNUE | X | X | 158 368 | |
| | | | | | Total | 1 065 412 |

* 2017 : Octobre et Décembre 2017

Les montants indiqués dans le tableau sont indicatifs étant donné que les montants qui seront réellement disponibles seront seulement connus en Octobre 2017 (suite à la mise en place des activités prévues dans le cadre du PTBA 2018). Ils sont néanmoins en cours d'évaluation avec les engagements et les activités prévues durant la période allant jusqu'en Septembre 2017.



Le Secrétaire du comité de Pilotage
Dr Napari YEO
Point Focal du processus REDD+ intérimaire
Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ intérimaire
République de Côte d'Ivoire

MINISTÈRE DE LA SALUBRITÉ DE
L'ENVIRONNEMENT ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail




REDD+
CÔTE D'IVOIRE

PROGRAMME
ONU-REDD

Compte Rendu du Deuxième Comité de Pilotage 2017 **CÔTE D'IVOIRE**

Programme ONU-REDD/FAO

Abidjan, 26 Mai 2017

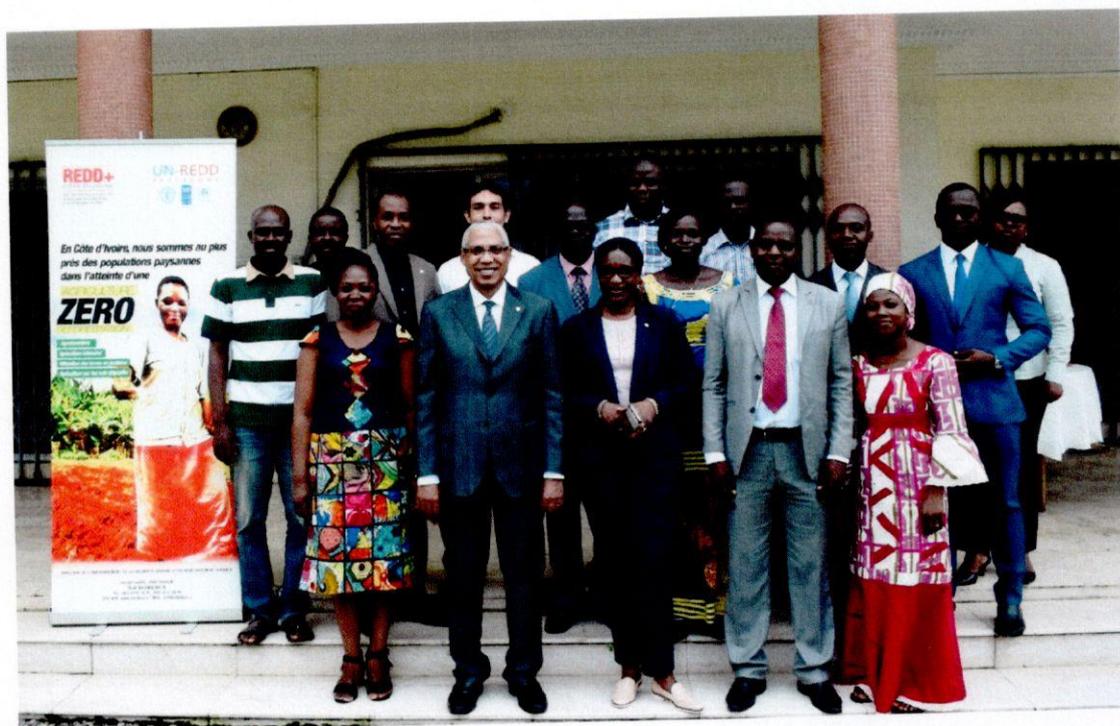

INTRODUCTION

Depuis Janvier 2015, le Programme ONU-REDD appuie la Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre de son Plan de Préparation à la REDD+ à travers un programme national. Cet appui de 3,210,000 USD, est orienté essentiellement sur les aspects techniques notamment le renforcement de la gestion institutionnelle du processus REDD+, la construction de la stratégie nationale REDD+, la mise en place de l'outil de Mesure, Notification et Vérification, le développement du niveau de référence des forêts et le développement du mécanisme de Paiements pour services environnementaux.

Pour une mise en œuvre efficace des activités dudit programme, un Comité de Pilotage (COFIL) a été mis en place en Décembre 2014. Ce COFIL est un organe de coordination, de prise de décisions et d'orientation stratégique de l'exécution du Programme National ONU-REDD en Côte d'Ivoire.

Afin de contenir le retard dans l'exécution du plan de travail annuel, qui pourrait entraver l'atteinte des résultats, le Comité de pilotage s'est réuni en session extraordinaire le vendredi 26 mai 2017 au bureau du Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ (SEP-REDD+) pour analyser et approuver la proposition de prorogation sans frais additionnel que la Côte d'Ivoire souhaite soumettre au programme ONU-REDD.

Les participants à cette réunion extraordinaire du comité de pilotage, étaient composés des représentants de la société civile, des ministères membres du comité de pilotage et impliqués dans le processus REDD+, des 3 agences des Nations Unies, membres du Programme ONU-REDD (voir liste de présence en annexe).

Trois points étaient inscrits à l'ordre du jour :

- i. Présentation de la proposition de requête ;
- ii. Recueil des commentaires et observations des membres du comité de pilotage ;
- iii. Approbation de ladite proposition.

DEROULEMENT DE LA REUNION

La réunion a débuté par les mots de remerciements et de bienvenue du Coordonnateur intérimaire de la REDD+.

A suivi, l'allocution du Représentant Résident de la FAO, co-président du comité de pilotage. Le Représentant de la FAO, dans le même élan que le Coordonnateur de SEP-REDD+, a remercié les participants pour leur présence. Il a ensuite félicité et encouragé le SEP-REDD+ pour les résultats obtenus dans la mise en œuvre du programme national ONU-REDD, avant préciser que des efforts restent à faire pour l'atteinte des objectifs du programme.

Avant de clore les allocutions officielles, le Coordonnateur, après avoir présenté les excuses au nom du représentant du MINSEDD, co-président du comité de pilotage, a ouvert la séance.

I. PRESENTATION DE LA PROPOSITION DE REQUETE

Avant la présentation de la proposition d'extension du programme national ONU-REDD en Côte d'Ivoire, le Coordonnateur a rassuré les partenaires techniques et financiers (PTF) quant à l'engagement de l'Etat à tout mettre en œuvre pour l'atteinte des objectifs du mécanisme REDD+ en Côte d'Ivoire.

A sa suite, le Représentant Résident de la FAO a aussi rassuré le gouvernement de la totale disponibilité des agences du programme ONU-REDD à accompagner le processus.

Sur ce, la présentation de la proposition d'extension a été présenté, en mettant en exergue les raisons principales de la demande de prolongation et le plan de travail révisé pour la période 2017-2018.

1. Les raisons de la demande de prorogation

Le retard pris dans la mise en œuvre des activités suite à la revue approfondie de la Banque mondiale.

Quelques activités comme l'élaboration du système d'information sur les sauvegardes, l'intégration de la stratégie dans les politiques sectorielles sont touchées par ce retard.

La prorogation n'aura pas d'impact financier (prolongation du programme national sans frais additionnel).

2. Le plan de travail révisé couvrant la période 2017-2018

La présentation du plan de travail a mis en exergue les différents groupes d'activités à réaliser et le budget à y associer. Le budget total sur la période 2017-2018 est évalué à 1.065.412 USD.

Suite à cette présentation, les membres du Comité de Pilotage ont fait leurs observations qui ont abouti à des recommandations telles qu'énumérées dans la section qui suit.

II. RECOMMANDATIONS ET OBSERVATIONS DU COMITE DE PILOTAGE

1. Par Rapport la fiche de PTBA

- Changer la description de la colonne « Responsable » pour « Responsable de Suivi »
- Reformuler l'activité 1.3.1 pour « Appui à la société civile... »

2. Par rapport les activités du programme :

- Etant donné que la demande de prolongation couvre une période supplémentaire de 7 mois, il faudrait s'assurer que le budget disponible puisse couvrir la mise en œuvre et la finalisation de toutes les activités du programme national durant toute cette période. Ceci implique l'étalement de la mise en œuvre des activités mais aussi de l'utilisation des fonds total disponible durant la période additionnelle
- S'assurer que des activités importantes touchant notamment la société civile soient clairement mises en œuvre (appui à l'OI-REN, participation à la COP 23 dans la mesure du possible), sans que les montants prévus de leur mise en œuvre soient réduits.
- Favoriser la synergie entre le FLEGT et la REDD+, notamment en présentant conjointement ces mécanismes lors d'événements internationaux, en réalisant des études qui peuvent servir en même temps aux deux mécanismes, et ceci avec l'appui des PTF

- Mettre en exergue l'aspect genre dans la mise en œuvre des activités du programme national
- Des corrections de formes doivent être apportées dans la planification et le budget de la période : les institutions responsables doivent être énoncées, certains titres doivent être corrigés et ajustés.
- Les acquis du programme national et plus largement du processus REDD+ de la Côte d'Ivoire doivent être systématiquement disséminés, valorisés et publiés dans la mesure du possible

III. VALIDATION DE LA PROPOSITION DE PROLONGATION DU PROGRAMME ET CLOTURE DE LA REUNION

Après les différents échanges et recommandations faites par les membres du COPIL, le Comité de Pilotage a approuvé la demande d'extension sans frais additionnel du programme national pour une durée de 7 mois supplémentaire par acclamation.

Fait à Abidjan, le 26 mai 2017



Le Secrétaire du comité de Pilotage
 Dr Napari YEO
 Point Focal du processus REDD+,
 Secrétariat Exécutif Permanent REDD+
 République de Côte d'Ivoire

ANNEXE : 1 : Liste de présence



Scane-Liste de
presence_copil_mai 17
