

REPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE
Union - Discipline - Travail



MINISTÈRE DE LA SALUBRITÉ,
DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE


REDD+
CÔTE D'IVOIRE

Réduction des Emissions de gaz à effet
de Serre issues de la Déforestation,
et de la Dégradation des Forêts

PROGRAMME
ONU-REDD



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation
et l'agriculture



**PREMIERE REUNION
DU COMITE DE PILOTAGE
DU PROGRAMME
ONU-REDD DE 2017**

1er COPIL 2017

Abidjan, le 31 janvier 2017

PROGRAMME
ONU-REDD



Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation
et l'agriculture



Au service
des personnes
et des nations

RÉPUBLIQUE DE CÔTE D'IVOIRE



MINISTÈRE DE LA SALUBRITÉ,
DE L'ENVIRONNEMENT, ET DU
DÉVELOPPEMENT DURABLE

**Programme national
Rapport à mi-parcours
Comité de Pilotage**

CÔTE D'IVOIRE

Programme ONU-REDD/FAO

Janvier 2017

SIGLES ET ABRÉVIATIONS

Table des matières

| | |
|--|----------|
| SIGLES ET ABRÉVIATIONS | 3 |
| Table des matières..... | 3 |
| Liste des tableaux | 3 |
| 1. Contexte..... | 4 |
| 2. Présentation des résultats pour l'année 2016..... | 5 |
| 2.1 Principaux résultats obtenus pour l'année 2016..... | 5 |
| 2.2 État de mise en œuvre du Programme National | 6 |
| Résultat 1 : La coordination et l'implication des parties prenantes sont renforcées..... | 6 |
| Résultat 2 : Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en œuvre | 7 |
| Résultat 3 Un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) alimenté par des FE et des DA préliminaires et relié au Système d'information sur les Sauvegardes (SIS) est conçu de manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles..... | 9 |
| 2.3 Résultats en Statistiques..... | 10 |
| 2.4 Liste des études réalisées en 2016 | 11 |
| 2.5 Activités complémentaires | 11 |
| 3. Rapport financier | 12 |
| 4. Difficultés et Recommandations..... | 14 |
| 5. Plan de Travail et Budget 2017 | 15 |
| Résultat 1 La coordination et l'implication des parties prenantes sont renforcées..... | 15 |
| Résultat 2 Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en œuvre | 19 |
| Résultat 3 Un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) alimenté par des FE et des DA préliminaires et relié au Système d'information sur les Sauvegardes (SIS) est conçu de manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles..... | 24 |
| 6. ANNEXES | 27 |
| ANNEXE 1 : RAPPORT DE PARTICIPATION DU SEP REDD+ A LA COP 22 | 29 |

Liste des tableaux

| | |
|---|----|
| Tableau 1 : Taux d'exécution budgétaire..... | 12 |
| Tableau 2 : Détails de l'utilisation budgétaire | 13 |

1. Contexte

Le document de préparation à la REDD+ de la Côte d'Ivoire, a été endossé par le programme ONU-REDD avec un accord de financement de 3, 210, 000 USD, signé en Novembre 2014.

Pour une mise en œuvre efficace des activités REDD+ dudit programme, un Comité de Pilotage a été mis en place comme l'organe de coordination, de prise de décisions et d'orientation stratégique de l'exécution du Programme. Il est constitué des responsables des structures gouvernementales et des Agences du Système de Nations Unies (FAO, PNUD, PNUE) impliquées ainsi que des représentants de la société civile et du secteur privé.

Le Comité de pilotage se réunit au moins deux fois par an et autant de fois que nécessaire, à la demande d'un de ses coprésidents principalement pour approuver les plans de travail et budgets annuels, et réviser le progrès.

Depuis janvier 2015, le Comité de pilotage s'est réuni quatre fois pour valider les plans de travail, apprécier les bilans à mi-parcours et pour un renforcement des capacités sur les changements climatiques et le mécanisme REDD+. Le Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ (SEP REDD+) qui constitue l'organe de gestion quotidienne du processus REDD+ national et qui assure le secrétariat dudit comité préparera et partagera un compte-rendu suite à chaque séance de travail, dans un délai de dix (10) jours.

Avant le début formel des activités de l'année 2017, il est nécessaire de faire le bilan des activités de l'année 2016 puis de valider le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2017, qui inclut les activités et le budget nécessaires pour la troisième année du programme, qui permettra au pays d'atteindre ses objectifs de la phase de préparation.

C'est dans ce contexte que le Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ (SEP-REDD+) organise la première réunion du comité de pilotage de l'année 2017

Le présent document fait ainsi l'état de la réalisation du Programme National ONU-REDD en Côte d'Ivoire en 2016 (rapport financier et technique). Il propose également le Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) 2017 du programme national ONU-REDD

2. Présentation des résultats pour l'année 2016

Les informations ci-dessous décrivent les réalisations du programme, conformément au contenu du PTBA de 2016 (validé lors de la première réunion du COPIL en 2016, le 21 Janvier) et de la révision des activités du programme intervenu en Octobre 2016.

2.1 Principaux résultats obtenus pour l'année 2016

L'année 2016 a été l'année de la consolidation de la préparation du mécanisme REDD+ en Côte d'Ivoire. À partir de la consolidation de l'équipe de travail du Secrétariat Exécutif Permanent (SEP-REDD) et l'appui quotidien du conseiller technique principal du programme, ainsi que des experts régionaux des agences regroupées au sein de l'ONU-REDD, la Côte d'Ivoire compte avec des outils solides pour lancer, de manière anticipée, les projets d'investissement de REDD+.

Sur le plan légal et institutionnel, le Gouvernement a créé le Comité National REDD+ et le Comité Technique Interministériel REDD+. Par ailleurs, le programme ONU-REDD a appuyé l'élaboration code forestière ainsi que la rédaction de huit décrets d'application alignées aux activités REDD+ et FLEGT, qui renforcent la vision du Ministère des Eaux et Forêts (MINEF) dans la gestion et l'aménagement forestier.

Sur le plan technique, le pays a constitué les outils nécessaires, les arrangements institutionnels et les questions méthodologiques pour la mise en œuvre du « cadre de Varsovie » (décisions 10-15 / COP 19) :

1. Le pays compte avec un Système National de Surveillance de Forêt (SNSF), conformé par une cellule MNV (basée au SEPREDD) et l'appui des institutions techniques comme le BNETD, la SODEFOR, le CNRA, le CURAT, le Bureau de Changement Climatique et l'INPHB. Ainsi que pour institutions internationales comme l'IRD et le projet OSFACO. Afin de doter le gouvernement d'informations transparentes et cohérentes des causes de la déforestation et la dégradation, le SNSF a produit la première carte de la dynamique forestière du pays de 1990-2000-2015 et a fait une analyse qualitative des causes¹. L'estimation de la couverture forestière du pays en 2015 est de 3,4 millions d'ha avec un taux de déforestation (2000-2015) de 2.69% annuel.
2. Le Niveau des Émissions de Référence des Forêts (NERF), qui serve de base d'évaluation de des efforts faits par le pays dans le cadre de la REDD+, a été soumis à la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC)²
3. La stratégie nationale REDD+ a été développée de manière participative (plus de 100 personnes de différentes institutions, ont travaillé et présentée à la COP 22 dans sa première version, propose des options stratégiques spécifiques au contexte, qui visent à mettre en place des politiques et mesures que le Gouvernement de Côte d'Ivoire utilisera pour mettre en œuvre avec succès, tant au niveau sectoriel, mais aussi au niveau intersectoriel pour d'abord stopper la déforestation et la dégradation des forêts, et pour reconstituer progressivement le couvert forestier pour atteindre au moins 20% du territoire national.
4. D'autres instruments ont été élaborés par le SEP-REDD pour la mise en œuvre de la REDD+, parmi lesquelles une analyse spatiale des bénéfices multiples pour la planification de la REDD+ ou encore la cartographie des flux financiers liés à l'utilisation des terres constitue la base pour


¹ https://www.dropbox.com/s/inis4bc9qq75k1z/Analyse_Facteurs_Def-Deg_CI_Rapport_Final.pdf?dl=0

² http://redd.unfccc.int/files/01_01_2017_rci_nerf_version_finale.pdf

la construction de la Stratégie Nationale REDD+ pour faire face aux principaux moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts ivoiriennes.

5. Le travail sur **les garanties sociales et environnementales** a été lancé lors d'une formation sur les exigences et les garanties de CCNUCC.

2.2 État de mise en œuvre du Programme National

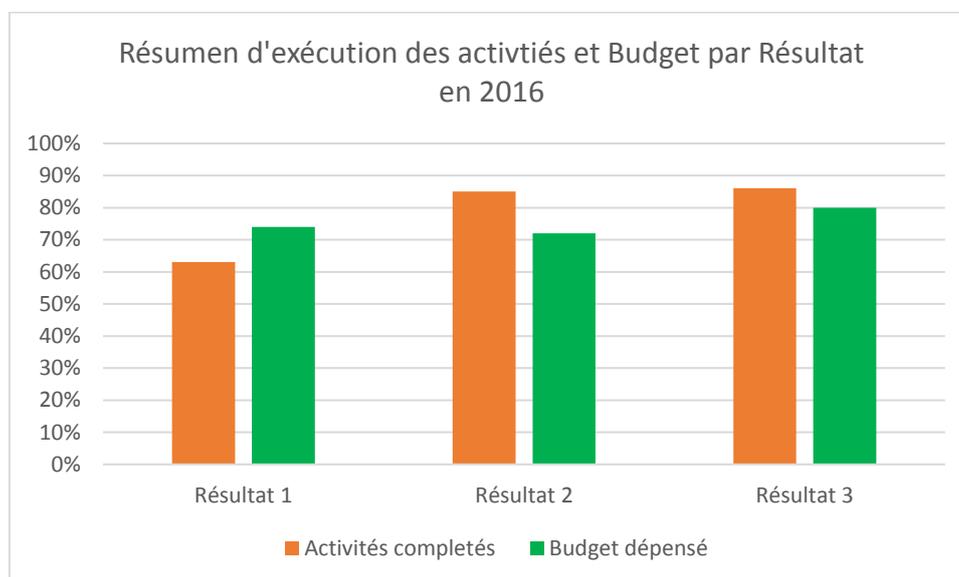

Résultat 1 : La coordination et l'implication des parties prenantes sont renforcées

Budget exécuté 2016 : \$ 282,775 (74%)

Activités réalisées en 2016: 12 (63%)

Réalisation 1.1. Gestion nationale du processus REDD+ et du programme ONU-REDD en Côte d'Ivoire
Deux réunions du comité de pilotage se sont tenues respectivement en Janvier et en Octobre 2016.

La première a permis d'analyser et valider le plan de travail et le budget de 2016, et la seconde d'évaluer les résultats à mi-parcours et faire une révision des activités du programme national.

Les activités font l'objet d'un suivi systématique par le SEPRED+ et également par le Programme ONU-REDD.

Réalisation 1.2. Renforcement de l'équipe nationale de gestion

Le CTP et l'assistante administrative et financière sont en place, opérationnels, et appui au quotidien le SEP REDD+ dans ses activités.

Une retraite de travail tenue les 10, 11 et 12 Mars 2016 à Grand Bassam a permis au SEP REDD+ de définir sa vision et mettre à jour son organigramme pour être plus efficace.

Le programme s'est réuni 5 fois (07/03, 19/04, 11/05, 20/07 et le 24/11/2016) pour le suivi des activités et pour donner des orientations générales sur la mise en œuvre et sur le contenu technique du programme.

Réalisation 1.3. Renforcement de l'engagement multipartenaire autour de la REDD+

Le soutien à l'organisation de la société civile, y compris l'appui aux activités de la plateforme OI-REN de la société civile et la mise en œuvre du Plan d'engagement des parties prenantes ainsi que le

renforcement de la communication autour du mécanisme REDD+ ont permis de renforcer la participation et l'engagement de la société civile et des autres parties prenantes au processus REDD+ au cours de l'année 2016. Plusieurs activités ont été ainsi réalisées :

- Les capacités de 100 étudiants de l'INPHB, en particulier de l'École Supérieure d'agronomie (ESA) et de 50 acteurs du monde agricole ont été renforcées en agriculture durable, en changement climatique et sur le mécanisme REDD+;
- Les capacités des membres des comités national (20 membres) et technique interministériels (23 membres) ont été renforcées sur le changement climatique, le mécanisme REDD+ REDD+, politique d'agriculture zéro déforestation, Sauvegardes environnementales et sociales (SESA) et Système National de Surveillances des Forêts ;
- Les élèves et les enseignants et des clubs environnement (une centaine) de la sous-préfecture d'Affery informés et sensibilisés les Changements Climatique et le mécanisme REDD+ ;
- Les communautés locales des localités d'Akoupé, de Didiévi et Toumodi (plus de 150 personnes) ont été informées et sensibilisées sur le mécanisme REDD+, les projets pilotes REDD+, et l'importance de leur engagement dans la mise en œuvre des projets pilotes ;
- Des supports de communication (flyers) sur les activités REDD+, la vision émergente REDD+ ont été produits ce qui a permis de renforcer la communication autour de la REDD+ en Côte d'Ivoire ;
- L'Observatoire Ivoirien pour la gestion durable des Ressources Naturelles a amélioré son draft de manuel de procédures Administratives, Comptables et Financières ;
- Les parties prenantes des Journées Nationales pour la Valorisation de l'Agriculture, des ressources animales et halieutiques ont été informées et sensibilisées sur les changements climatiques, le mécanisme REDD+, la stratégie nationale REDD+ (649 Personnes touchées par les différentes thématiques) ;
- Les capacités de quatre-vingt-dix-huit neuf (99) représentants des organisations de jeunesse ivoirienne sur les changements climatiques et le mécanisme REDD+ ont été renforcée, les négociations internationales dans le cadre de la 22^{ème} Conférence des Parties et dans la perspective d'impliquer la jeunesse ivoirienne, le Secrétariat Exécutif permanent REDD+ a renforcé ;
- Un atelier a été organisé, pour l'analyse diagnostique du fonctionnement de l'OI-REN, dans un souci d'amélioration du fonctionnement de cette plateforme ;
- Une délégation ivoirienne (10 personnes) a pris part à la vingt-deuxième Conférence des Parties sur le changement climatique. Cette participation a permis à la Côte d'Ivoire de signer plusieurs protocoles d'accord dont celui avec le Costa Rica. Également cette délégation a participé aux side-events sur différentes thématiques, ce qui a permis un renforcement de capacités (Cf annexe 1).

Résultat 2 : Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en œuvre

Budget exécuté 2016 : \$ 651,883 (72%)

Activités réalisées en 2016: 25 (85%)

Réalisation 2.1. L'analyse sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts est effectuée

L'analyse a été subdivisée en deux parties :

- Une analyse cartographique et quantitative réalisée par BNETD, avec l'appui de la Cellule S&MNV de SEP-REDD+.
- Et une analyse sur les aspects qualitatifs réalisée par ETC TERRA.

Les résultats de cette analyse ont été validés lors de deux ateliers nationaux tenus les 11 et 27 en Octobre 2016-, et les rapports sont disponibles.

Réalisation 2.2. Définition et formulation des options stratégiques REDD+

Cinq (5) groupes thématiques ont été formés au niveau des ministères sectoriels impliqués dans la déforestation et leurs capacités ont été renforcées. Chacun des groupes a réalisé 9 réunions pour formuler des politiques et mesures propres à leurs secteurs pour adresser les moteurs de la déforestation.

Pour le Ministère du Plan, un outil de planification de type T21 a été élaboré et une équipe technique de 10 personnes a été formée pour assurer la manipulation de l'outil.

Au niveau des forêts classées, la politique de contractualisation de la SODEFOR a fait l'objet de révision de façon participatif pour son amélioration.

Les avis des organes et structures décentralisés, la société civile et les communautés locales sur les politiques et mesures proposées par les groupes thématiques ont été recueillis et pris en compte. Ce qui a permis d'avoir une version 2016 de la stratégie améliorée et présentée à la Cop 22

Réalisation 2.3. Construction de la Stratégie nationale REDD+

Sur la base des résultats des travaux de groupe et des études lancées, un travail de consolidation a été réalisé pour rédaction de la stratégie nationale REDD+ et des consultations régionales, deux retraites scientifiques du SEP-REDD+ ont été nécessaires pour l'obtention de la version 2016 de la stratégie améliorée et présentée à la Cop 22.

Le dialogue avec les filières agricoles a été renforcé avec l'appui du PNUD GCP qui a abouti à la signature 2 MOU avec la filière Palmier et Hévéa et Un MOU avec le Groupe CEMOI.

Réalisation 2.4. Cartographie des financements liés à l'utilisation des terres

Une étude de cartographie des financements publics a été lancée en vue de leurs alignements pour la mise en œuvre de la stratégie REDD+, pour le compte du Ministère de l'Économie,

Réalisation 2.5. Un niveau de référence / niveau d'émission de référence (NR/NER) est élaboré

Un atelier de lancement de l'activité permettant de faire un état des lieux des besoins et des données disponibles a été réalisé. Le consultant en charge de l'élaboration de la méthodologie et de l'élaboration du document sur le NERF/NRF a été recruté.

Le NERF/NRF a été soumis par le point focal de changement climatique du pays à la CCNUCC le passé 2 janvier 2017.

Réalisation 2.6. Analyse spatiale des bénéfices multiples

L'évaluation des services écosystémiques a été validée, en Juin 2016, auprès des parties prenantes pertinentes. Une formation de deux jours visant à garantir l'appropriation du modèle économique parmi des cadres techniques des Ministères, des centres des recherches et de la société civile a eu également lieu en Juin 2016. Une présentation de l'étude et du modèle au Directeur de Cabinet du Ministère des Eaux et Forêts a été réalisée lors de la même mission de validation.

Une formation d'une semaine sur la **cartographie des bénéfices multiples** adressée aux experts techniques nationaux a été réalisée en Mai 2016 avec le soutien technique du Centre mondial de surveillance de la conservation du PNUE (UNEP WCMC). Les participants ont été introduits à la

technologie SIG-open source et ont préparé les premières ébauches des cartes. Une mission de validation de cartes auprès de la Cellule SIG au SEP-REDD s'est du 18 au 21 octobre 2016. La mission visait également d'assurer une coordination entre le chantier cartographie et d'autres chantiers des travaux dont notamment la Stratégie nationale et les activités liées au suivi forestier.

Résultat 3 Un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) alimenté par des FE et des DA préliminaires et relié au Système d'information sur les Sauvegardes (SIS) est conçu de manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles

Budget exécuté 2016 : \$ 345,871 (80%)

Activités réalisées en 2016: 9 (86%)

Réalisation 3.1. Les parties prenantes sont formées sur les méthodes de collecte et de suivi des DA et FE

La cellule S&MNV a été renforcée avec le recrutement de 3 spécialistes en SIG et télédétection contractuels et de 2 fonctionnaires ; et son espace de travail a été totalement aménagé.

Les membres de la cellule, au nombre de 6, sont en place et ont reçu des formations en matière :

- d'utilisation des outils libres développés par la FAO pour le suivi des forêts ;
- d'évaluation de précision des cartes produites ;
- d'inventaire forestier.

Réalisation 3.2. Les DA et FE existantes sont compilées dans des bases de données

Des accords de collaboration et de partage des données ont été signés avec les structures nationales pour le SNSF.

Les collectes de données sur les FE ont été lancées avec la collaboration de la SODEFOR et une pleine implication de la cellule S&MNV du SEP-REDD.

Les cartes compilées de l'évolution du couvert forestier entre 1990 et 2015 sont disponibles au sein de la cellule S&MNV du SEP-REDD, dans une base de données créée à cette fin.

Réalisation 3.3. Des DA et FE préliminaires sont établis selon les besoins identifiés par le SEP REDD+

Une évaluation faite par la cellule S&MNV a abouti à la décision de ne pas réaliser la digitalisation prévue des cartes étant donné que celles-ci sont disponibles auprès de BNETD

Réalisation 3.4. L'entretien et le fonctionnement du portail pour le SNSF est assuré

Le plan d'action pour le Système National de Surveillance des Forêts a été élaboré de manière participative par plusieurs parties prenantes relevant de plusieurs institutions. Le plan d'action a été validé en Septembre 2016 lors d'un atelier national.

Réalisation 3.5. Système d'Information sur les Sauvegardes (SIS) alimenté par des données préliminaires intégré au SNSF

Le travail sur **les garanties sociales et environnementales** a été lancé lors d'une formation³ sur les exigences, les garanties de la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique (CCNUCC), les synergies et différences entre les garanties exigées par la CCNUCC et la Banque

³ 18 personnes composées d'assistant Technique du SEP REDD+ et de futurs membres du comité sur les garanties

Mondiale, et le développement d'un système d'information sur les garanties en Côte d'Ivoire, les 18 et 19 octobre 2016.

Le Centre Suisse de Recherche Scientifique a été identifié comme partenaire national pour le déroulement de ce travail.

Un Assistant Technique du SEP REDD+ a pris part à la vingt-deuxième Conférence des Parties sur le changement climatique. Cette participation se situait dans le cadre de la présentation de la stratégie nationale REDD+ et de la participation à plusieurs side event relatif aux garanties environnementales et sociales dans la gestion forestière. (Cf annexe 1)

2.3 Résultats en Statistiques.



La participation du Secrétariat Exécutif Permanent REDD+ à plusieurs événements et la tenue d'atelier de sensibilisation, ont permis d'informer, de sensibiliser et renforcer les capacités des parties prenantes (> 1000 personnes) sur les changements climatiques et le mécanisme REDD+ et aussi aux négociations internationales sur le climat. Ces personnes comprennent mieux les défis liés à la préservation de nos forêts et par ricochet le climat mondial.



Après une analyse diagnostique du fonctionnement de la plateforme de la société civile et des politiques et mesures de la version 2016 de la stratégie, les membres de la plateforme de la société civile ont (1) reconnu l'existence de nombreux dysfonctionnement en leur sein ; (2) fait des propositions pour un meilleur fonctionnement et (3) améliorés le draft de la stratégie nationale REDD+.

Aussi, les avis des organes et structures décentralisés, la société civile et les communautés locales sur les politiques et mesures proposées par les groupes thématiques ont été recueillis et pris en compte. Ce qui a permis d'avoir une version 2016 de la stratégie améliorée, qui a ensuite été présentée à la Cop 22.

La participation de la Côte d'Ivoire à la COP 22 a permis de signer plusieurs protocoles d'accord (dont celui avec le Costa Rica), à participer aux side-events sur différentes thématiques, ce qui a permis un renforcement de capacités. Désormais plusieurs thématiques sur les changements climatiques sont mieux comprises et le Costa Rica et la Côte d'Ivoire peuvent mettre en œuvre des actions concrètes partagées.

Les graphiques ci-dessous classent les activités réalisées par les différentes agences à travers le Sep REDD+, par types, genre, lieu de travail, etc.





2.4 Liste des études réalisées en 2016

1- Étude sur l'identification et la cartographie des facteurs de déforestation et de dégradation des forêts / Analyse historique de la déforestation

Cette étude vise à identifier et caractériser tous les moteurs de la déforestation et de la dégradation en Côte d'Ivoire ainsi que les barrières au développement des activités « + », ce qui permettra de formuler les axes d'intervention stratégique adaptés, à mettre en œuvre à court et à moyen terme dans le cadre de la mise en œuvre du mécanisme REDD+

2- Évaluation de la contribution des services écosystémiques forestiers à l'économie nationale

L'étude a été réalisée aux fins de la création d'un prototype des comptes forestiers de la Côte d'Ivoire. Ces comptes des forêts respectent les meilleures pratiques internationales de l'Organisation des Nations Unies ainsi que les données du gouvernement de la Côte d'Ivoire et de la FAO pour valoriser les stocks et les débits des forêts ivoiriennes et de leurs services écosystémiques aussi bien que pour établir un lien entre ces derniers et l'économie de la Côte d'Ivoire.

3- Analyse et la cartographie des financements liés à l'utilisation des terres et propositions des réformes fiscales

L'objectif de l'analyse est d'améliorer le niveau de compréhension du paysage financier de l'utilisation des terres en Côte-d'Ivoire, dans le but de:

- ✓ Alimenter la Stratégie nationale REDD + qui doit être finalisé d'ici décembre 2016
- ✓ Contribuer au dialogue politique sur les priorités nationales d'investissement
- ✓ Proposer les réformes et mesures permettant de réaligner les financements existants aux objectifs de la REDD+
- ✓ Influencer les priorités de financement des bailleurs de fonds.

2.5 Activités complémentaires

La collecte des informations sur la biomasse forestière afin de définir les facteurs d'émission de la Côte d'Ivoire est également soutenue par les fonds complémentaires mis à disposition par la FAO et le FCPF, et qui ne relèvent pas du Programme National ONU-REDD de la Côte d'Ivoire

3. Rapport financier

Tableau 1 : Taux d'exécution budgétaire

| Résultats du programme | Agence des NU | Taux décaissement 2016 |
|---|---------------|------------------------|
| Résultat 1 : La coordination et l'implication des parties prenantes sont renforcées | FAO | 76% |
| | PNUD | 71% |
| | PNUE | - |
| <i>Sous-total 1</i> | | <i>66%</i> |
| Résultat 2 : Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en œuvre | FAO | 93% |
| | PNUD | 62% |
| | PNUE | 98% |
| <i>Sous-total 2</i> | | <i>47%</i> |
| Résultat 3 : Un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) alimenté par des FE et des DA préliminaires et relié au Système d'information sur les garanties (SIS) est conçu de manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles | FAO | 93% |
| | PNUD | - |
| | PNUE | 37% |
| <i>Sous-total 3</i> | | <i>85%</i> |
| | FAO | 87% |
| | PNUD | 64% |
| | PNUE | 95% |
| Total des coûts directs du Programme (tous résultats) | | 77% |

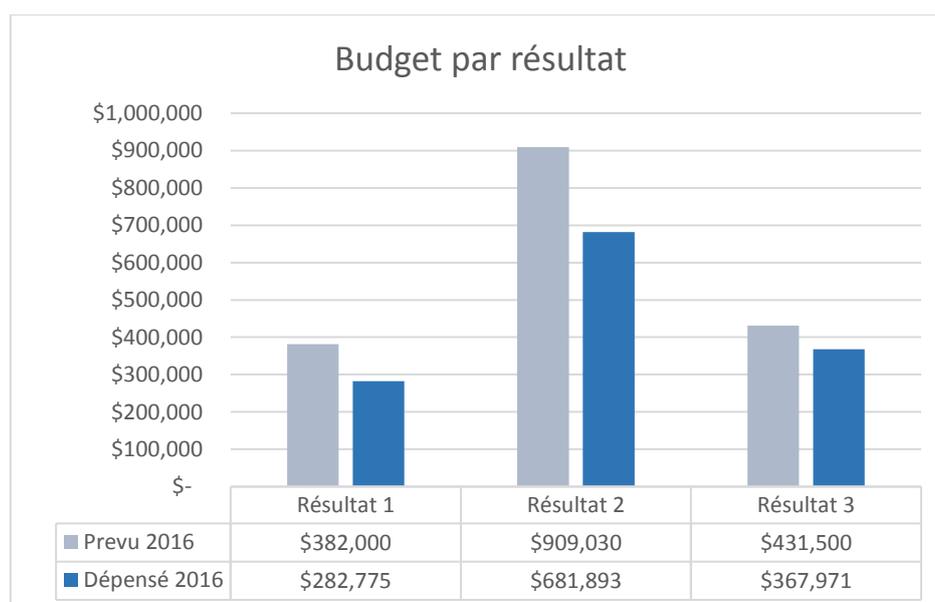


Tableau 2 : Détails de l'utilisation budgétaire

| Résultats du programme | Agence des NU | Montant transféré | Budget prévu 2015 | Budget prévu 2016 ⁴ | Dépenses 2015 | Dépenses 2016 | Dépenses 2015 + 2016 |
|---|---------------|-------------------|-------------------|--------------------------------|----------------|------------------|----------------------|
| Résultat 1 : La coordination et l'implication des parties prenantes sont renforcées | FAO | 565,000 | 178,500 | 247,000 | 53,860 | 186,676 | 240,536 |
| | PNUD | 275,000 | 125,000 | 135,000 | 209,978 | 96,099 | 306,077 |
| | PNUE | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| <i>Sous-total 1</i> | | 840,000 | 303,500 | 382,000 | 263,838 | 282,775 | 546,613 |
| Résultat 2 : Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en œuvre | FAO | 430,000 | 280,000 | 130,000 | 113,975 | 120,658 | 234,632 |
| | PNUD | 890,000 | 407,000 | 649,000 | 159,410 | 403,225 | 562,635 |
| | PNUE | 180,000 | 118,000 | 130,030 | 21,990 | 158,010 | 180,000 |
| <i>Sous-total 2</i> | | 1,500,000 | 805,000 | 909,030 | 295,375 | 681,893 | 977,268 |
| Résultat 3 : Un SNSF alimenté par des FE et des DA préliminaires et relié au SIS est conçu de manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles | FAO | 500,000 | 150,000 | 371,500 | 93,339 | 345,871 | 439,209 |
| | PNUD | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | PNUE | 160,000 | - | 60,000 | - | 22,100 | 22,100 |
| <i>Sous-total 3</i> | | 660,000 | 150,000 | 431,500 | 93,339 | 367,971 | 461,309 |
| Total des coûts du Programme (tous résultats) | | 3,000,000 | 1,258,500 | 1,722,530 | 652,551 | 1,332,639 | 1,985,190 |
| Frais de soutien indirects | FAO | 104,650 | 42,595 | 52,395 | 18,282 | 45,724 | 64,006 |
| (7 % GMS) | PNUD | 81,550 | 37,240 | 54,880 | 25,857 | 34,953 | 60,810 |
| | PNUE | 23,800 | 8,260 | 13,302 | 1,539 | 12,608 | 14,147 |
| Frais de soutien indirects (Total) | | 210,000 | \$ 88,095 | 120,577 | 45,679 | 93,285 | 138,963 |
| FAO (Total) : | | 1,599,650 | 651,095 | 800,895 | 279,455 | 698,929 | 978,384 |
| PNUD (Total) : | | 1,246,550 | 569,240 | 838,880 | 395,245 | 534,277 | 929,522 |
| PNUE (Total) : | | 363,800 | 126,260 | 203,332 | 23,530 | 192,718 | 216,247 |
| TOTAL : | | 3,210,000 | 1,346,595 | 1,843,107 | 698,230 | 1,425,923 | 2,124,153 |

⁴ Revision Budgétaire Octobre 2016

4. Difficultés et Recommandation

Le défi majeur de ce programme est d'arriver à engager toutes les parties prenantes dans le mécanisme REDD+ et à avoir une stratégie nationale REDD+ acceptée de tous. Toutefois, pour relever ces défis, le SEP REDD+ c'est retrouvé confronté à certaines difficultés.

4.1 Difficultés

Les principales difficultés recensées dans la mise en œuvre du programme en 2016, sont principalement liées :

- **Au fonctionnement de la plateforme de la société civile**
 - ✓ Mauvaise coordination ;
 - ✓ Problème de communication et
 - ✓ Le problème de leadership au sein de la l'OIREN) ;
- **Aux procédures à appliqués (PNUD)**
 - ✓ Changement de procédure de paiement des DSA en plein exercice ;
 - ✓ Retard dans la validation des paiements par MTN avant l'activité ;
 - ✓ Paiements des factures des prestataires
- ✓ **Au fonctionnement de la task force interministérielle** (Absence de réunion, l'arrêté de mise en place de cette task force était nécessaire pour son fonctionnement)

4.2 Recommandations

Pour une meilleure mise en œuvre du programme durant l'année 2017, il est important de :

- Procéder à la validation du manuel de procédures de l'OIREN,
- Appliquer les dispositions de la charte de la plateforme de la société civile,
- Dégager le profil idéal des représentants de l'OIREN, et
- Améliorer l'exécution des activités : les fonds doivent être mis à disposition à temps et les nouvelles procédures doivent être appliquées un an après adoption, ce qui permettra de mieux les comprendre avant l'application.

5. Plan de Travail et Budget 2017

Résultat 1 La coordination et l'implication des parties prenantes sont renforcées

| Résultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en œuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------|--|---------------|-------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Réalisation 1.1 | Gestion nationale du processus REDD+ et du programme ONU-REDD en Côte d'Ivoire | | | | | | | | | | |
| Activité 1.1.1 | Suivi des activités mises en œuvre | FAO | SEP/REDD+ | Marcel Yao | Missions de terrain | 12.000 | 6.960.000 | X | X | X | X |
| Activité 1.1.2 | Réunion du Comité de Pilotage | FAO | SEP/REDD+ | Marcel Yao | Réunion de validation du Plan de travail et budget annuel (1) / Réunion à mi-parcours / Réunion d'évaluation à la fin de l'année | 4.000 | 2.320.000 | X | | X | X |
| Activité 1.1.3 | Evaluation finale du programme | FAO | FAO | Carlos Riano | Evaluation finale du programme | 25.000 | 14.500.000 | | | | X |
| | | | | | Sous-total | 41.000 | 23.780.000 | | | | |
| Réalisation 1.2 | Renforcement de l'équipe nationale de gestion | | | | | | | | | | |
| Activité 1.2.1 | Chargé des Operations ONU-REDD RCI (cadre international) | FAO | FAO | Carlos Riano | Salaire 12 mois | 180.000 | 104.400.000 | X | X | X | X |
| Activité 1.2.2 | Assistant administratif et financier | FAO | FAO | Carlos Riano | Salaire 12 mois | 16.000 | 9.280.000 | X | X | X | X |
| Activité 1.2.3 | Fonctionnement de l'équipe national de gestion | FAO | FAO | | Missions à l'intérieur et l'extérieur, achat de papeterie et divers, local labour | 11.000 | 6.380.000 | X | X | X | X |

| Résultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en œuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|------------------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------|---|----------------|--------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Activité 1.2.4 | Réunions mensuelles | FAO | FAO | Carlos Riano | 12 réunions inter agences | 1.000 | 580.000 | X | X | X | X |
| Activité 1.2.5 | Renforcement des capacités et formation de l'équipe de gestion du programme ONU-REDD et du comité de pilotage ONU-REDD | FAO | SEP/REDD+ | Mahamane | Retraites et réunions SEPRED+ | 12.000 | 6.960.000 | X | | X | |
| Activité 1.2.6 | Coordonner l'information et la communication du programme ONUREDD | FAO | SEP/REDD+ | Hemman | Couverture médiatique des activités ONUREDD+ et sponsoring spécifiques | 25.000 | 11.600.000 | X | X | X | X |
| | | FAO | SEP/REDD+ | Hemman | Outils de communications et gadgets | 5.000 | 11.600.000 | X | X | X | X |
| | | FAO | SEP/REDD+ | Hemman | Edition et publications de documents ONUREDD+ | 9.000 | 5.220.000 | X | X | X | X |
| | | | | | sous-total | 259.000 | 120.640.000 | | | | |
| Réalisation 1.3 | Renforcement de l'engagement multipartenaire autour de la REDD+ >> Focus: Appui à l'Observatoire Ivoirien pour la Gestion des Ressources Naturelles (OIREN) / plateforme société civile << | | | | | | | | | | |
| Activité 1.3.1 | Structuration interne de la société civile renforcée | PNUD | SEP-REDD/OIREN | Alloua Kadjo | Assemblée générale de l'OIREN_ finalisation et validation du manuel de procédure administrative et financière de l'OIREN, statuer sur la formalisation de l'OIREN y | 20.000 | 11.600.000 | X | | | |

| Résultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en œuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|----------------|---|-----------------|-------------------------------|--------------|---|--------|---------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| | | | | | compris séances de travail pour la préparation et développement d'un plan de formation, cadre d'échanges formel SEP-REDD/Société civile. Atelier de révision de la charte | | | | | | |
| | | PNUD | SEP-REDD/OIREN | Alloua Kadjo | Recrutement d'un consultant international d'appui pour l'exercice d'auto-évaluation de la société civile | 10.000 | 5.800.000 | X | | | |
| | | PNUD | SEP-REDD/société civile | Alloua Kadjo | Ateliers d'auto-évaluation de la société civile | 10.000 | 5.800.000 | X | | | |
| Activité 1.3.2 | Formation de l'équipe de gestion de l'application Web sur son utilisation | PNUD | SEP-REDD/OIREN | Alloua Kadjo | Prorogation du contrat du consultant National pour former le SEP-REDD+ et l'OIREN l'utilisation de l'application web | 2.000 | 1.160.000 | | X | | |
| | | PNUD | SEP-REDD/OIREN | Alloua Kadjo | Formation du SEP-REDD+ et de l'OIREN pendant 3 jours sur l'utilisation de l'application web | 1.000 | 580.000 | | X | | |
| Activité 1.3.3 | Renforcement des capacités techniques de la société civile par le SEP-REDD et suivi des général des activités | PNUD | SEP-REDD+ | Alloua Kadjo | Inventaires des besoins en renforcement des capacités et paiement d'indemnité du personnel de suivi des activités | 10.000 | 5.800.000 | X | X | X | X |
| Activité 1.3.4 | Renforcement de la communication autour du mécanisme | PNUD | SEP/REDD+ | Marc Zako | Campagne de sensibilisation dans les écoles (théâtres, génie en herbe, sketch, planting | 20.000 | 11.600.000 | X | X | X | |

| Résultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en œuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|----------------|--|-----------------|-------------------------------|--------------|--|---------------|-------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| | REDD+ en Côte d'Ivoire | | | | d'arbre, installation pancarte REDD+) | | | | | | |
| Activité 1.3.5 | Consultation de la société civile sur la stratégie nationale REDD+ | PNUD | SEP-REDD+/OI-REN | Alloua Kadjo | Séances de travail sur la version 2016 de la stratégie nationale | 5.000 | 2.900.000 | | | | |
| | | | | | sous-total | 73.000 | 42.340.000 | | | | |

Résultat 2 Une stratégie nationale REDD+ est préparée, adoptée et prête à être mise en œuvre

| Resultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en oeuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------|---|--------|---------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Réalisation 2.1 | Définition et formulation des options stratégiques REDD+ | | | | | | | | | | |
| Activité 2.1.1 | Finalisation de la stratégie national REDD+ et préparation du plan d'investissement | PNUD | SEP-REDD+/SODEFOR | Jean Paul Aka | Soutien technique à la SODEFOR pour la finalisation et la mobilisation des acteurs sur la politique nationale de contractualisation et atelier de validation | 10.000 | 5.800.000 | X | | | |
| | | PNUD | SEP-REDD+ | Jean Paul Aka | Dialogue de politique et atelier de haut niveau avec les groupes thématiques pour présentation de la stratégie nationale REDD+ en vue de leur intégration dans les documents politiques sectoriels (revue par les pairs, identification des écarts, articulation entre les options) | 10.000 | 5.800.000 | | | X | X |
| | | PNUD | SEP-REDD+ | Jean Paul Aka | Renforcement des capacités matériels et technique de la cellule Stratégie du SEP-REDD+ y compris paiement d'indemnités du personnel d'appui à recruter | 20.000 | 11.600.000 | X | X | X | |
| Activité 2.1.2 | Intégration de la REDD+ dans la planification nationale du développement et | PNUD | MPD/MEF/SEP-REDD+ | Jean Paul Aka | Séances de travail de renforcement des capacités de l'équipe nationale T21 (Transport, impression de documents, etc.) | 5.000 | 2.900.000 | X | | | |

| Resultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en oeuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|----------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------|---|--------|---------------|---|-------|-----------|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| | dans la prospective dans l'horizon 2040 à travers le développement de l'outil modélisation du modèle T21 de Millenium Institue | PNUD | MPD/MEF/SEP-REDD+ | Jean Paul Aka | Mobilisation de l'expertise du MI pour la formation de l'équipe nationale T21 ainsi que le développement des indicateurs (Economiques, sociaux et Environnementaux) pour l'actualisation du PND et l'élaboration des PIP, y compris au moins un atelier de renforcement des capacités de l'équipe national T21 et de formation de cadre nationaux | 25.000 | 14.500.000 | X | X | X | X |
| | | | | | | | | Appui au fonctionnement de la Task Force interministérielle (Fournitures de bureau, réunions mensuelles de partage d'information et d'échanges, missions de terrain etc.) | 5.000 | 2.900.000 | X |
| Activité 2.1.3 | Appui à la coopération bilatéral sud-sud entre la Côte d'Ivoire et le Costa Rica | PNUD | SEP-REDD+ | Jean Paul Aka | Préparation et mise en œuvre du plan de travail entre la Côte d'Ivoire et le Costa Rica | 10.000 | 5.800.000 | X | | | |
| Activité 2.1.4 | Missions de renforcement de capacité, d'échanges | PNUD | SEP/REDD+ Cel. Consult | Jean Paul Aka | Au moins deux Voyages y compris la participation à la COP 22 | 30.000 | 17.400.000 | | X | X | X |

| Resultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en oeuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|------------------------|--|-----------------|--------------------------------|---------------|--|----------------|-------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| | d'expérience, participation aux évènements spécifique au niveau international y compris participation à la COP23 | | | | Side Event de présentation à la COP23 du plan d'investissement de la stratégie nationale REDD+ et mobilisation des PTFs (Impression, Interprète, etc.) | 10.000 | 5.800.000 | | | | x |
| | | | | | sous-total | 125.000 | 72.500.000 | | | | |
| Réalisation 2.2 | Construction de la Stratégie nationale REDD+ | | | | | | | | | | |
| Activité 2.2.1 | Appui-conseil de l'initiative "Filières vertes" du PNUD et partenariats publique-privés | PNUD | PNUD-CGP/SEP-REDD+ | Jean Paul Aka | Appui à la mise en place et au fonctionnement de la plateforme de dialogue national sur l'agriculture zéro déforestation y compris la mobilisation et l'engagement des agro-industriels (Temps de travail GCP, séance de travail et réunion) - green commodities | 15.000 | 8.700.000 | x | x | x | x |
| | | PNUD | PNUD-CGP/SEP-REDD+ | Jean Paul Aka | Appui aux filières agricoles (Palmier à Huile, Hévéa et Cacao) pour l'adaptation des documents stratégiques (Temps de travail GCP, réunion et séance de travail) | 12.000 | 6.960.000 | | x | | |
| | | PNUD | PNUD-CGP/SEP-REDD+ | Jean Paul Aka | Renforcement des capacités des experts de la cellule stratégie du SEP-REDD sur les "commodités vertes" et | 10.000 | 5.800.000 | | x | | |

| Resultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en oeuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|------------------------|---|-----------------|--------------------------------|---------------------|--|---------------|-------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| | | | | | l'organisation des plateformes (Mission, formation, etc.) | | | | | | |
| | | PNUD | PNUD-BUREAU PAYS | Jean Paul Aka/Danae | Appui à la préparation de financement du GCF (12 jours) | - | - | | | | |
| | | | | | sous-total | 37.000 | 21.460.000 | | | | |
| Réalisation 2.3 | Un niveau de référence / niveau d'émission de référence (NR/NER) est élaboré | | | | | | | | | | |
| Activité 2.3.1 | Prolongation du contrat du consultant national pour la mise à jour du NERF | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | Recrutement d'un consultant national + prise en compte des observations du TAP | 10.000 | 5.800.000 | X | X | X | X |
| Activité 2.3.2 | Mise à jour du NERF | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | Séances de consultations, Ateliers, Missions. | 12.000 | 6.960.000 | X | X | X | |
| Activité 2.3.3 | Appui à la mise en commun du NERF et le I-GES | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | 2 Missions d'une semaine expert international et formation de 10 consultants nationaux | 12.000 | 6.960.000 | X | X | X | |
| | | | | | sous-total | 32.000 | 19.720.000 | | | | |
| Réalisation 2.4 | Analyse spatiale des bénéfices multiples | | | | | | | | | | |
| Activité 2.4.1 | Évaluation de la contribution des services écosystémiques | PNUE | SEP/REDD+ Cel. | Kassi Serge | Finalisation, livraison et vulgarisation de l'étude | Pour Memoire | Pour Memoire | X | | | |

| Resultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en oeuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|----------------|---|-----------------|--------------------------------|-------------|---|--------------|---------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| | forestiers à l'économie nationale | | | | | | | | | | |
| Activité 2.4.2 | Étude de cartographie des bénéfices multiples pour la planification spatiale de la REDD+ en Côte d'Ivoire | PNUE | SEP/REDD+ Cel. | Kassi Serge | Finalisation, livraison et vulgarisation de l'étude | Pour Memoire | Pour Memoire | X | | | |
| | | | | | sous-total | - | - | | | | |

Résultat 3 Un Système National de Surveillance des Forêts (SNSF) alimenté par des FE et des DA préliminaires et relié au Système d'information sur les Sauvegardes (SIS) est conçu de manière transparente et les capacités nationales sont opérationnelles

| Résultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en œuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--------------|--|---------------|-------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Réalisation 3.1 | Les parties prenantes sont formées sur les méthodes de collecte et de suivi des DA et FE | | | | | | | | | | |
| Activité 3.1.1 | Fonctionnement de la cellule SIG/Téledétection | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Carlos Riano | LOA avec SEP REDD pour les salaires, électricité et entretien d'équipement | 62.000 | 35.960.000 | X | X | X | X |
| Activité 3.1.2 | Support cellule SIG, matériel et papeterie bureau | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | Achats de matériels, équipements, connexion internet | 13.000 | 7.540.000 | X | X | X | X |
| Activité 3.1.3 | Formation des structures nationales à l'utilisation des outils développés pour le MNV et les processus méthodologiques | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | 2 formations selon les besoins exprimés suite à la collecte des données des parcelles permanentes. 20 participants | 9.000 | 5.220.000 | | X | | X |
| Activité 3.1.4 | Vulgarisation et promotion de l'utilisation de la légende nationale de OCS LCCS | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | 1 formation x 20 participants 1 atelier national de présentation de la légende | 10.000 | 5.800.000 | X | X | | |
| | | | | | sous-total | 94.000 | 54.520.000 | | | | |
| Réalisation 3.2 | Les DA et FE existantes sont compilées dans des bases de données | | | | | | | | | | |
| Activité 3.2.1 | Atelier de formation sur la gestion des données (formats, | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | 1 atelier appuyé par le consultant national + HQ FAO | Pour | Pour Memoire | | X | | |

| Résultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en œuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|------------------------|--|-----------------|-------------------------------|--------------|---|---------------|-------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| | types de données, désignation de points focaux dans les structures) | | | | | Memoire | | | | | |
| Activité 3.2.2 | Soutien technique HQ | FAO | FAO | Carlos Riano | 1 consultant international | 35.000 | 20.300.000 | X | X | X | X |
| | | | | | sous-total | 35.000 | 20.300.000 | | | | |
| Réalisation 3.3 | Des DA et FE préliminaires sont établis selon les besoins identifiés par le SEP REDD+ | | | | | | | | | | |
| Activité 3.3.1 | Mise a jour de carte d'occupation du sol de 2015 et 2016 | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | En liaison avec la légende LCCS, les objectifs et besoins de la stratégie nationale REDD+ | Pour Memoire | Pour Memoire | X | X | X | |
| Activité 3.3.2 | Compilation et traitement des données de biomasse forestière collectées. | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | Mission de 2 personnes de la cellule SIG à Rome - Appui technique de FAO HQ | 8.000 | 4.640.000 | X | | | |
| Activité 3.3.3 | Appui à l'élaboration de la méthodologie et à la réalisation de l'inventaire forestier national | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | Appui à la définition de la méthodologie et à la réalisation de l'inventaire - formation - Appui de FAO/HQ - Missions de terrain | 12.000 | 6.960.000 | X | X | X | X |
| Activité 3.3.4 | Monitoring de l'occupation du sol dans les hotspots de déforestation avec des images de haute résolution et le drone | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | Conception d'une méthodologie pour l'automatisation de la tâche à partir d'un système d'alerte - atelier de validation de la méthodologie | 17.000 | 9.860.000 | X | X | | |

| Résultat | Activité | Agence ONU-REDD | Institutions de mise en œuvre | Responsable | Description et observations | Budget | Budget (FCFA) | Calendrier | | | |
|------------------------|---|-----------------|-------------------------------|-------------|---|----------------|-------------------|------------|----|----|----|
| | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 |
| Activité 3.3.5 | Monitoring des forêts à haut stocks de carbone | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | Cartographie des HCS - Définition d'une méthodologie de suivi -4 missions de terrain - atelier de validation de la méthodologie - implémentation du suivi | 17.000 | 9.860.000 | | X | X | X |
| Activité 3.3.6 | Creation d'un outil de suivi et d>alerts precoce de la deforestation. | FAO | FAO SEP/REDD+ Cel. MRV | Eric Konan | Développement d'un processus de suivi pour chaque option - identification des zones potentielles de futures déforestation - Liaison avec le portail SST | 11.000 | 6.380.000 | X | X | X | X |
| | | | | | sous-total | 65.000 | 37.700.000 | | | | |
| Réalisation 3.4 | Système d'Information sur les Sauvegardes (SIS) alimenté par des données préliminaires intégré au SNSF | | | | | | | | | | |
| | | | | | sous-total | 147,900 | 85,782,000 | | | | |

| | | |
|--------------|--------------------|-------------------------|
| TOTAL | 910,900 USD | 528,322,000 FCFA |
|--------------|--------------------|-------------------------|

6. Soutienne Technique ONUREDD

| | Livrables | Activités | Agence |
|---------------------------------|---|---|--------|
| Cadre National d'investissement | <p>Un Cadre National d'investissement pour l'implémentation de la stratégie REDD+ et les PEM, que:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Est dirigé / supervisé / repris par le ministère avec un mandat intersectoriel (budget, finances, planification ...); - Est lié au plan national de développement du pays et à la NDC; - S'appuie sur des analyses économiques et financières; - Élaborer des mesures de sauvegarde, de la «faisabilité» en matière de genre et de gouvernance; - Est validé par toutes les parties prenantes concernées (ministères sectoriels, IP, OSC et autres); - S'appuie sur des modalités de mise en œuvre claires et pragmatiques. | <ul style="list-style-type: none"> - Entreprendre des analyses économiques et de gouvernance de secteurs liés à DDFDB + pour affiner et opérationnaliser la Stratégie Nationale REDD +, en s'appuyant sur et en complétant les interventions existantes". - Affiner et renforcer l'élaboration d'une théorie du changement, d'un cadre de S & E et d'une base de référence pour les objectifs, les objectifs annuels et le processus de validation avec les IP et les OSC. - Soutenir les réunions interministérielles à divers niveaux, y compris la Commission nationale REDD + et le Groupe de travail interministériel REDD +. | PNUD |
| | <p>Des options quantifiées pour le financement innovant et structuré des politiques et mesures (PAMs) REDD+ sélectionnées sont identifiées, diffusées par le biais des collaborations publiques privées et intégrées dans le cadre national d'investissements REDD+</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Conceptualiser et développer des instruments financiers pour un certain nombre d'opportunités de financement public privé des politiques et mesures (PAMs) REDD+ sélectionnées sur base des analyses économiques conduites précédemment; - Valider les instruments financiers identifiés avec des parties prenantes clés des secteurs public et privé, y compris le secteur financier; - Examiner comment les technologies et les innovations «fintech» peuvent être utilisées pour stimuler et faciliter l'accès au financement, en particulier pour les petits producteurs et les communautés; - Inciter une ou deux collaboration(s) publique(s) privé(es) pour soutenir l'accès au financement de politiques et mesures (PAMs) REDD+ clés (par exemple: la gestion durable des forêts, le reboisement commercial et l'agroforesterie - au-delà du cacao) et promouvoir les liens pertinents avec des initiatives mondiales et sous-régionales comme le Consumer Goods Forum et TFA 2020. | PNUE |
| | <p>Des normes de certification ont été élaborées et des processus de traçabilité ont été conçus pour mobiliser des chaînes d'approvisionnement</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Assistance technique pour l'élaboration de normes nationales de certification et la | PNUD |

| | | | |
|--|---|---|------|
| | durables pour l'agriculture 'zéro déforestation' (un des PEM de la stratégie nationale REDD+), en s'appuyant sur les processus existants dans le pays | conception de processus de traçabilité pour une «agriculture zero déforestation». | |
| | Modèles pour l'accès des petits producteurs au financement mis en place et testés dans les secteurs prioritaires tout en soutenant l'agriculture zéro déforestation | <ul style="list-style-type: none"> - Développement des modèles pour l'accès des petits producteurs au financement (facilités de prêts spécialisées, options de prêts individuels et collectifs, microfinance, assurances-récoltes individuelles et collectives, évaluation du risque de crédit, garanties gouvernementales, etc.) pour des commodités prioritaires avec un ciblage sur les incitations gouvernementales aux partenariats de financement publics privés. - Promouvoir l'adoption de modèles parmi des parties prenantes stratégiques (ministères clés, coopératives, banques et assureurs ayant des mandats pertinents). | PNUE |
| SNSF | Le Système National de Surveillance des Forêts, qui répond aux exigences de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques renforcé en assurant l'interopérabilité aux niveaux national et sous-national | <ul style="list-style-type: none"> - Veiller à ce que le SNSF soit opérationnel au niveau national et sous-national, par le biais d'une unité de M & MRV imbriquée dans le SEP-REDD +. - Augmenter la mesure des plantations spécialement cacao et huile-palmier. - Développer la fonction de suivi des PAM, y compris la sensibilisation de la population et de la société civile. | FAO |
| | Mettre à jour le NERF | <ul style="list-style-type: none"> - Fournir des éclaircissements et des modifications au rapport de la proposition en 2017 à la suite des observations de la CCNUCC. | FAO |
| Stakeholder engagement and Safeguards for implementation | Amélioration de la capacité liée à la REDD + à travers les régions et les principaux groupes d'intervenants | <ul style="list-style-type: none"> - Mettre en œuvre le projet actuel de renforcement des capacités REDD + (y compris les capacités institutionnelles) dans les régions prioritaires clés de la REDD + où la mise en œuvre des activités est prévue. | PNUD |
| | Analyse des droits carbone | <ul style="list-style-type: none"> - Soutenir l'application des textes relatifs aux droits carbone pour compléter les textes mis en œuvre du code forestier. | FAO |
| | Opérationnalisation du SIS initié et aperçu du premier Résumé des informations sur les garanties produites | <ul style="list-style-type: none"> - Renforcement des capacités des institutions concernées (y compris la société civile) en matière de collecte, de compilation, de stockage et de diffusion des données. - Préparation des principaux accords de partage des données avec les organismes gouvernementaux compétents. - Aperçu du premier sommaire des renseignements. | PNUE |

8. ANNEXES

ANNEXE 1 : RAPPORT DE PARTICIPATION DU SEP REDD+ A LA COP 22



Rapport de
participation du SEI
